




Informatiesessie Natuurrealisatie

Belemmeringen Inrichting

Edwin Wolvekamp

07 mei 2025



Waar staan we nu?

In 2022 zijn een aantal afspraken gemaakt in de realisatiestrategie.

Daarnaast loopt het volgende:

- Lopend onderzoek naar minder afgraven: oplossing voor uitvoerbaarheid/kosten;
- Aanpassingen regels en evt kaart ganzenrustgebieden + zorgvuldige afweging (maatwerk);
- Afspraken met SBB over versnelling lopende inrichtingsopgave met o.a. hulp bij capaciteitsprobleem;
- Gesprekken gestart met andere TBO's. Op projectniveau resterende inrichtspgave in beeld brengen en afspraken maken;
- Hulp bij gemeenten bij Omgevingsplannen.

Realisatiecijfers Natuur (in hectare)

In hectares voor eind 2027	Doel per 1-1-'11 *	Realisatie '11 t/m '20*	Realisatie '21, '22, '23	Realisatie 2024	Restant per 1-1-2025	Opgenomen in begroting ('25) 2025-2027	Restopgave (indien begroting gehaald wordt), deze opgave is nog niet geprogrammeerd (ha)
Functieverandering (en daarna inrichting)	1.616 (=1570 + 46)	996*	84	39	497	150	347
Inrichting (incl. ha Functieverandering)	4.381 (=4264 + 117)	1.962*	542	94	1.783	700	1.083 (incl 347 ha FV die ook ingericht moet worden)
Groene Contour (voor 2040)	3000	56	8	0	2936	10	2936

* Administratieve correctie vanwege aanpassing van de cijfers door provincie Zuid-Holland ten gevolge van de gemeentelijke herindeling Gemeente Vijfheerenlanden (1-1-2019). Er is ook natuur gerealiseerd in het voormalige Zuid Hollandse deel van deze gemeente tussen 1-1-2011 en 1-1-2019. Het betreft hier 46 ha functieverandering en 117 ha inrichting. Deze cijfers zijn in de taakstelling en realisatie in bovenstaande cijfers verwerkt.

Nog in te richten door TBO's

Organisatie	Aantal hectares	Waarvan reguliere verpacht
SBB	735	22
NM	181	36
HUL	35	12
Landgoederen	10	0
Provincie	156	3

Versnellen door TBO's van natuurinrichting:

- SBB: versnellingsafspraken gemaakt;
- Natuurmonumenten: gestart met de inventarisatie.
- HUL: idem, en betreft slechts beperkte opgave waarvan voor de helft regulier verpacht.
- Landgoederen: beperkte opgave
- Eigen gronden: zitten voor een groot deel al in lopende projecten. Dat geldt ook voor een deel van de gronden van NM en SBB (GMNO en Marickenland).

Belemmeringen behalen natuurdoelen

In inrichtingsprojecten streven we naar hoge ambities natuur. In de praktijk lopen we er tegenaan dat deze typen soms lastig te realiseren zijn.

Redenen:

- Abiotische omstandigheden (potenties);
- Draagvlak en afspraken met compromis;
- Draagvlak/afspraken beheer door agrariers;
- Uitvoerbaarheid/kosten;
- Belemmeringen vanuit andere beleid (denk aan ganzenrustgebieden) maar ook bijvoorbeeld Hollandse waterlinie;
- Combinaties van natuurdoelen die strijdig kunnen zijn (denk aan weidevogelstellingen versus moeras);
- Recreatieve (of andere) mededoelstellingen.



Redenen vertraging inrichting

We zien dat inrichting van natuur lang duurt. Redenen zijn o.a:

- Reguliere pacht op nog in te richten gronden;
- Beperkte capaciteit van de organisaties;
- Afweging natuurtipe en draagvlak kost veel tijd en is complexer naar mate er hogere doelen worden nagestreefd. Voorsorteren op nieuw beleid (VHR doelen en vereisten overgangsgebieden);
- Planvorming kost vaak veel tijd (vooral in de grotere projecten);
- Politieke klimaat/weerstand. Ook in relatie tot aanpassingen Omgevingsplan. Rol gemeente;
- Complexiteit door raakvlakprocessen in het gebied zoals een kavelruil of dijkversterking;
- Restpercelen die niet beschikbaar zijn. Denk aan hydrologische systeemmaatregelen + besparing kosten om percelen in 1 keer in te richten;
- Vertraging geplande inrichting: slechte weersomstandigheden.






Aandachtspunten vervolg

- Resterende inrichting wordt komende tijd in beeld gebracht.
- Programmering van restopgave bij NM en HUL
- In beleidsuitwerking en in projecten aandacht voor doelsturing en VHR doelen

Hoofdlijn planning Beleidsprogramma natuur

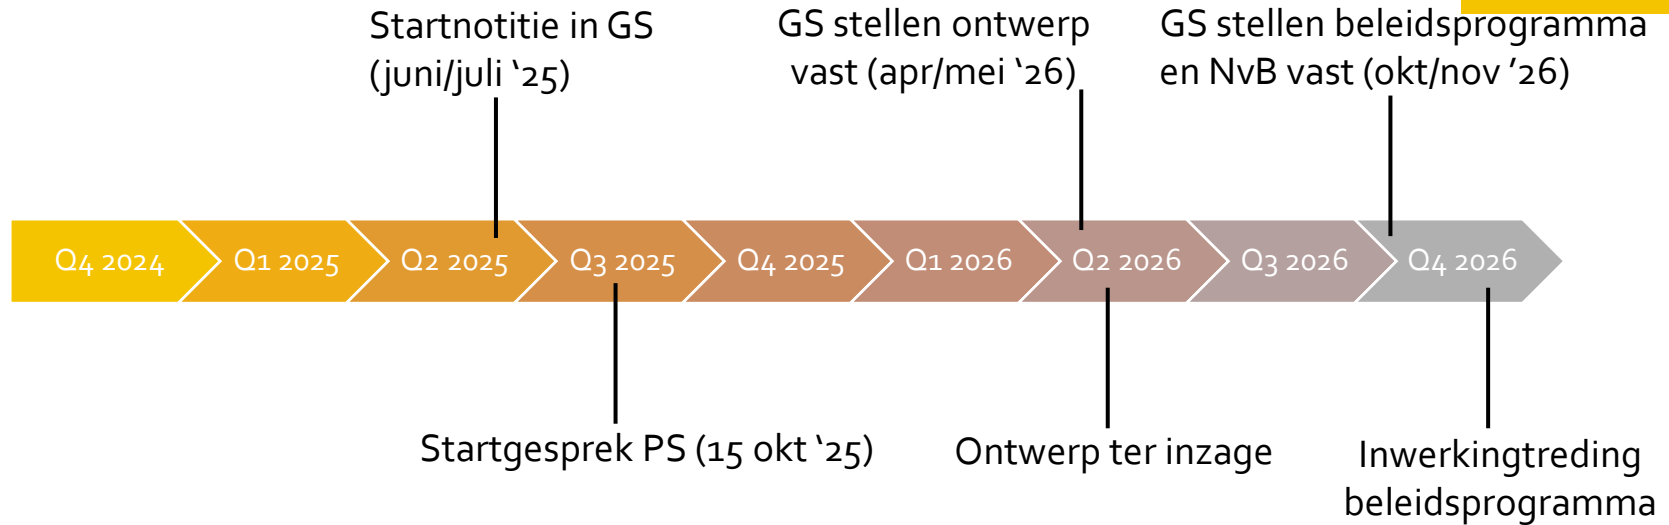

Vragen?

Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht

Postbus 80300
3508 TH Utrecht

telefoon (030) 258 91 11
fax (030) 258 38 48
