



Statenbrief

Aan Provinciale Staten

Onderwerp	Voortgang Hoogspanningsstations Utrecht Noord
Datum	11-11-2025
Documentnummer	UTSP-1457258195-10088
Van	Floor Osseweijer en Hans Kentie
Telefoonnummer	+31648083806
E-mailadres	floor.osseweijer@provincie-utrecht.nl
Domein/opgave	SLO
Team	Netcongestie
Portefeuillehouder	Van Essen
Bijlagen	1. Verzoek TenneT inzake nadere verkenning HSS Utrecht Noord 2. Reactiebrief GS aan TenneT op verzoek nadere verkenning HSS Utrecht Noord 3. Aanvullende kennisgeving kabelverbindingen Utrecht Noord

Geachte leden van Provinciale Staten,

Essentie / samenvatting:

De provincie Utrecht heeft in steeds toenemende mate te kampen met een tekort aan transportcapaciteit op het stroomnet; netcongestie. In de provinciale aanpak netcongestie zijn veel projecten urgent (zie de Utrechtse [pMIEK 2.0](#) voor een lijst met de meest urgente projecten), maar een aantal projecten cruciaal. Het gaat dan om de projecten Breukelen Kortrijk 380 kV, Utrecht Noord 150 kV en Amersfoort Noord 150 kV. Middels deze statenbrief wordt u geïnformeerd over de recente stappen die door ons zijn gezet in het project Utrecht Noord, waarvoor wij een projectprocedure voeren. Dit project is tevens onderdeel van de prioritaire congestieverlichtende projecten van het ministerie van Klimaat en Groene Groei (KGG) en TenneT, gericht op snellere uitbreiding van het hoogspanningsnet, en heeft daarom onze volle aandacht.

In een [statenbrief gedateerd 10 juni jl.](#) hebben wij u geïnformeerd dat TenneT zoeklocatie Haarrijn toevoegt aan de procedure voor Utrecht Noord, door deze locatie verder te onderzoeken en hierop aanvullend te participeren met de omgeving. Dit heeft inmiddels plaatsgevonden en TenneT heeft ons op 27 oktober jl. verzocht om de verdere verkenning en participatie te richten op zoeklocatie Haarrijn en de bijbehorende kabeltracés, zie bijgevoegde brief. Wij zijn bereid om medewerking te verlenen aan het vervolgen van de projectprocedure met deze zoeklocatie als meest kansrijke richting, onder voorbehoud dat enkele in reactie naar TenneT genoemde aandachtspunten in acht worden genomen. Voor de participatie op de kabeltracés zal een aanvullende kennisgeving worden gepubliceerd. Dit wordt verder toegelicht in bijgevoegde reactiebrief aan TenneT.

Tevens bent u in bovengenoemde statenbrief geïnformeerd over de zoektocht naar een geschikte locatie voor een Stedin hoogspanningsstation ten noordwesten van Utrecht, met inbegrip van locatie Haarrijn. Stedin heeft een haalbaarheidsstudie afgerond en de participatie voortgezet met zoeklocaties III, IV, V, X en XIII als meest kansrijk.

Inleiding:


In de afgelopen periode is uitgebreid onderzoek gedaan naar het vinden van een geschikte locatie voor het hoogspanningsstation Utrecht Noord, voor zowel TenneT als Stedin. In het originele zoekgebied van TenneT en Stedin zijn potentiële locaties afgevalen om diverse redenen, waaronder ligging binnen het UNESCO werelderfgoed Hollandse Waterlinies. Voor TenneT resteerden twee locaties; ten noorden van Maarssenbroek (5) en ten noorden van Maarssen Dorp langs het Amsterdam Rijnkanaal (6). Vervolgens is locatie 5 voor TenneT vanwege de bereikbaarheid en bodemgesteldheid niet mogelijk gebleken en hebben wij niet kunnen instemmen met verzoek van TenneT om medewerking te verlenen aan het verder uitwerken van locatie 6, vanwege onder andere de ruimtelijke gevolgen voor cultureel erfgoed, landschap, water- en bodemgesteldheid, de nabijheid van vele woningen, de bezwaren van gemeente Stichtse Vecht en de aanwezigheid van een reële alternatieve zoeklocatie die tijdens de participatie en in gesprekken met Rijkswaterstaat (RWS) inzake bereikbaarheid is aangedragen (Haarrijn). De overige alternatieve locaties die tijdens de participatie zijn aangedragen en als beperkt kansrijk zijn beoordeeld in de second opinion (locatie E, F, K en L), zijn na onderzoek niet kansrijk gebleken. Redenen hiervoor zijn onder andere ligging in Natuurnetwerk Nederland (NNN) en benodigde uitplaatsing van functies. Wij hebben TenneT op 10 juni jl. verzocht om de participatie en analyse op zoeklocatie Haarrijn op te starten. Hierover hebben wij op 18 juni 2025 een [aanvullende kennisgeving voor TenneT](#) gepubliceerd. Daarnaast heeft Stedin het zoekgebied herijkt omdat in haar oorspronkelijke zoekgebied geen geschikte locatie is gevonden. Stedin zoekt nu naar een geschikte locatie voor een hoogspanningsstation ten noordwesten van de stad Utrecht. Hierover hebben wij op 18 juni 2025 een [aanvullende kennisgeving voor Stedin](#) gepubliceerd.

Voortgang TenneT

Zoeklocatie Haarrijn is door TenneT in beschouwing genomen in een haalbaarheidsstudie, hierop is aanvullend geparticipeerd met de omgeving en TenneT heeft een analyse gedaan naar de technische consequenties voor de bijbehorende kabeltracés. Op basis daarvan geeft TenneT aan geen aanleiding te zien om af te zien van het verder onderzoeken van locatie Haarrijn. TenneT heeft ons verzocht de verdere verkenning en planuitwerking te richten op locatie Haarrijn als meest kansrijke locatie voor het realiseren van het 150kV hoogspanningsstation Utrecht Noord, en hiermee medewerking te verlenen aan (1) de uitwerking van het hoogspanningsstation in een ontwerpprojectbesluit en (2) het opstarten van de verdere verkenning en participatie voor de bijbehorende kabeltracés. Het zoekgebied Haarrijn van TenneT en de zoekgebieden voor de ondergrondse verbindingen zijn weergegeven in Figuur 1 en Figuur 2. Wij zijn op basis van de onderbouwing door TenneT bereid om medewerking te verlenen aan het richten van de verdere verkenning en participatie op zoekgebied Haarrijn en de bijbehorende kabeltracés. Daarbij hebben we enkele aandachtspunten meegegeven met betrekking tot de inpassing van het station in het agrarisch cultuurlandschap, met voldoende afstand tot woningen en zoveel mogelijk rekening houdend met het aandachtsgebied stiltegebied, evenals de combinatie met de Stedin-ontwikkeling en de participatie op het voorgaande. Tevens zullen wij een aanvullende kennisgeving publiceren om de participatie op de ondergrondse kabelverbindingen aan te kondigen, zie bijlage. Een nadere toelichting op het doorlopen proces en vervolg kunt u vinden in onze bijgevoegde reactiebrief aan TenneT.




Figuur 1 – Zoekgebied TenneT Utrecht Noord Haarrijn

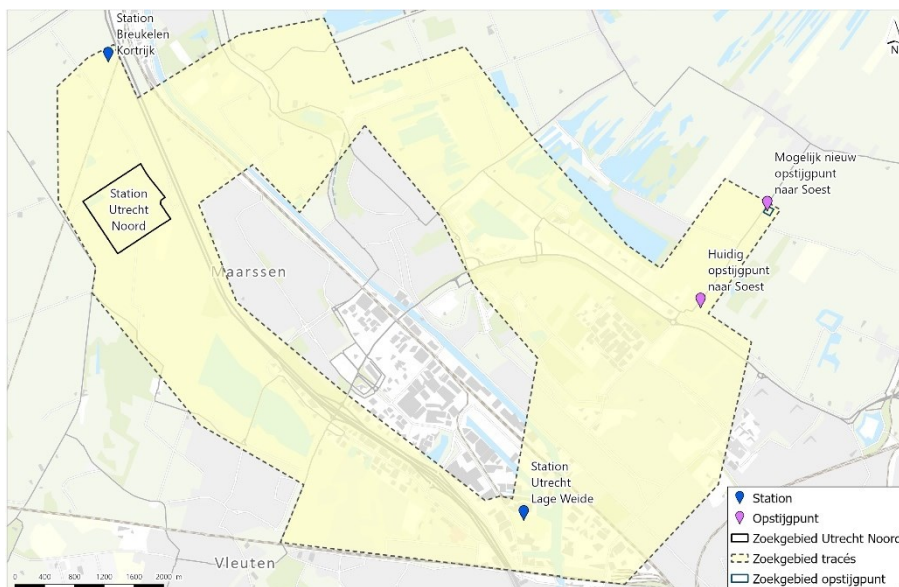

Figuur 2 – zoekgebied TenneT ondergrondse kabelverbindingen vanaf Utrecht Noord

Voortgang Stedin

Stedin heeft een haalbaarheidsstudie afgerond en gepubliceerd voor de verschillende zoeklocaties voor een nieuw hoogspanningsstation in het gebied Utrecht Noordwest. Stedin heeft de omgeving inmiddels geïnformeerd dat zij de participatie voortzetten op zoeklocaties III, IV, V, X en XIII. Voor zoeklocaties III, IV en V geldt een overlap met Haarrijn, daarom wordt deze participatie gezamenlijk met TenneT georganiseerd. Het zoekgebied van Stedin en de kansrijke zoeklocaties zijn weergegeven in Figuur 3.

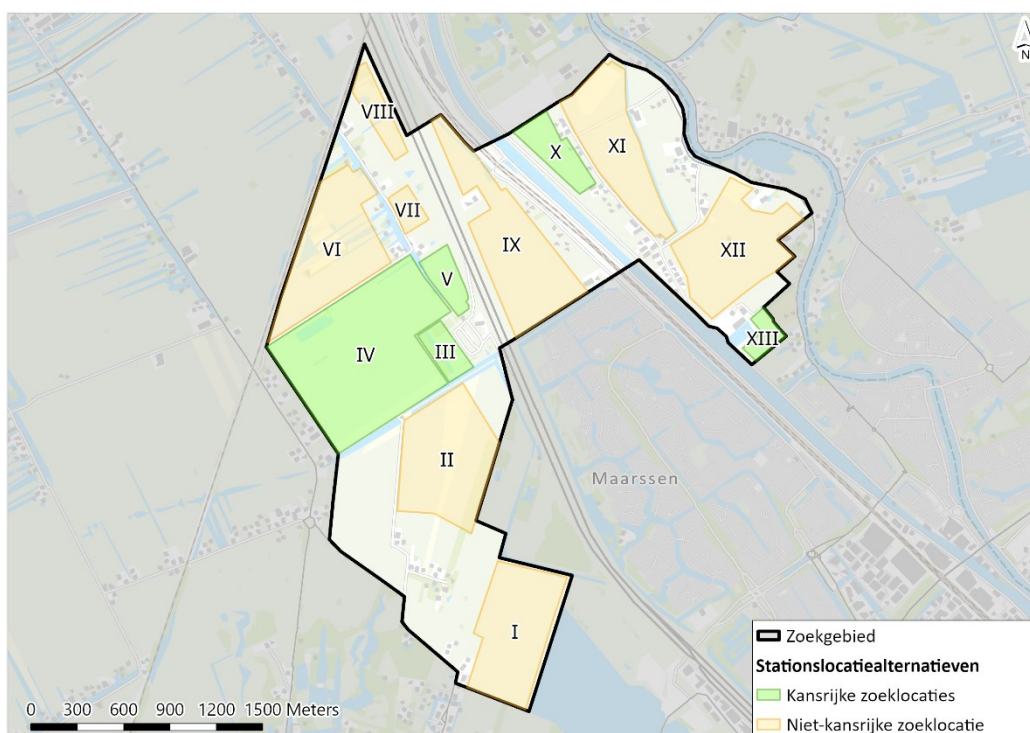

Figuur 3 – Zoekgebied Stedin Utrecht Noordwest, met kansrijke zoeklocaties III, IV, V, X en XIII.

Maatschappelijke en bestuurlijke belangen

Gezien de urgentie van de aanpak netcongestie en de soms tegengestelde belangen van de betrokken partijen (omwonenden, netbeheerders, provincie, gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat etc.), gebeurt besluitvorming rondom Utrecht Noord in een zeer complex veld. Hierbij spelen maatschappelijke, ruimtelijke, technische en politieke factoren een rol en zal besluitvorming dus vaak enige weerstand oproepen bij bepaalde partijen. In de gemeente Stichtse Vecht wordt het elektriciteitsnet bovendien op meerdere locaties uitgebreid. Demissionair minister Hermans heeft zich op 3 november jl. laten informeren over de impact hiervan in de gemeente Stichtse Vecht.


Utrecht Noord is tevens onderdeel van de projectenaanpak netcongestie, waarin het ministerie van Klimaat en Groene Groei (KGG) samen met netbeheerders en medeoverheden werkt aan snellere realisatie van prioritaire netcongestieverlichtende projecten. Deze aanpak uit zich in beleidsmaatregelen, aanpassing van wet- en regelgeving, gebiedsinvesteringen, het optimaliseren van TenneT's werkwijze en meer betrokkenheid van het Rijk bij het versnellen van individuele projecten. Dit heeft onze volle aandacht.

Vervolgprocedure / voortgang:

Werkwijze Projectbesluiten GS-PS

Voor Utrecht Noord voeren wij een projectprocedure. Bij de projectprocedure werken we zoals is afgesproken in de [Werkwijze Programma's en Projectbesluiten](#). In onze [statenbrief van 19 maart 2024](#) t.b.v. het startgesprek hebben wij toegezegd u na afloop van de verkennende fase te informeren over onze bevindingen, het resultaat van de participatie, inclusief de bevindingen die van gemeentezijde zijn gedaan. Hoewel de verkennende fase voor beide projecten nog niet is afgerond informeren wij u nu tussentijds. Voor zover we dit nu kunnen overzien is geen nadere kaderstelling vanuit Provinciale Staten noodzakelijk. Mocht hiervan alsnog sprake zijn, dan zullen wij daartoe een voorstel ter besluitvorming aan u aanbieden.

Stappenschema Projectprocedure

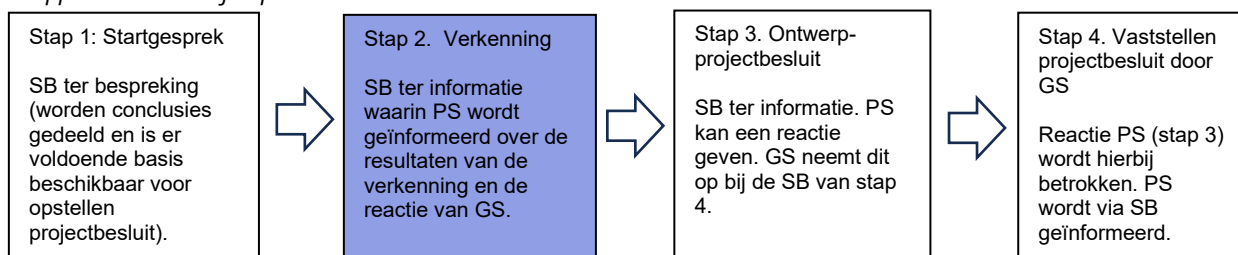

Planning en vervolgstappen

Onderstaande tabel weergeeft de beoogde vervolgstappen voor deze projectprocedure. PS zullen opnieuw worden geïnformeerd wanneer meer bekend is over het vervolg van de verkenning voor het Stedin-station, naar verwachting eind Q1 / begin Q2 2026.

Wat	Wanneer	Toelichting
Kennisgeving voornemen en participatie Utrecht Noord	Okt '24	Kenbaar maken richting omgeving dat proces wordt opgestart (onderdeel van verkenning)
Aanvullende kennisgeving participatie TenneT Haarrijn	Jun '25	Kenbaar maken richting omgeving dat locatie Haarrijn aan het proces wordt toegevoegd (onderdeel van verkenning)
Aanvullende kennisgeving voornemen en participatie Stedin Utrecht Noordwest	Jun '25	Kenbaar maken richting omgeving dat proces voor Stedin-locatie wordt opgestart in een nieuw zoekgebied (onderdeel van verkenning)
Aanvullende kennisgeving participatie TenneT kabeltracés	Nov '25	Kenbaar maken richting omgeving dat het proces voor participatie over de ondergrondse kabeltracés van TenneT wordt opgestart (onderdeel van verkenning)
Nadere verkenning (loopt)	Eind 2026	- Participatie en inspraak (loopt) - Onderzoeken (loopt) - Verzoek aan GS tot richten van verkenning TenneT op meest kansrijke locatie (nov '25) - Verzoek aan GS tot richten van verkenning Stedin op meest kansrijke locatie (Q1 '26)

		- Uitwerking tracés en inpassing stations - Uitvoeren onderzoeken
Ontwerp projectbesluit	Begin 2028	- Voorbereiden projectbesluit - Beantwoording zienswijzen
Projectbesluit	2028	
Beroepsprocedure	2029	
Realisatie en ingebruikname stations Stedin en TenneT, incl. kabelverbindingen	2033-2035	Partijen onderzoeken gezamenlijk hoe realisatie versneld kan worden, als onderdeel van de projectaanpak netcongestie

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter,
mr. J.H. Oosters

Secretaris,
mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen
